

# 석면비산측정 결과보고서

- 신안군 지도읍 태천리 394-8 슬레이트 철거공사 -



**한국안전환경컨설팅(주)**

Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479

F. 062-511-5480

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호

접수일

제출인

상호(대표자)

(주)순흥건설

주소

광주광역시 북구 동림동 1291번지 601호 (전화번호: 062-383-3314)

사업자등록번호

410-86-33022

건 축 물

건물명

신안군 지도읍 태천리 394-8

연면적(㎡)

㎡

석면건축자재[길이(m) · 면적(㎡) · 부피(㎥)]

슬레이트 : 1874.0 ㎡

위치

신안군 지도읍 태천리 394-8

작업기간

2013. 01. 30. ~ 2013. 01. 31.

측정기관

대표자

정 영 훈

주 소

광주광역시 서구 동천동 588

사업자등록번호

409-86-10335

측정 일시

2013. 01. 30. ~ 2013. 01. 31.

측정 결과

시료번호

측정 지점

측정 결과(f/cc)

검출석면

별첨2 참고 - 공사구역에 한하여 측정 실시.

측정 지점 위치(도식도)

별첨1 참고

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

년 월 일

제출인 (서명 또는 인)







특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장 귀하


첨부서류

「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본

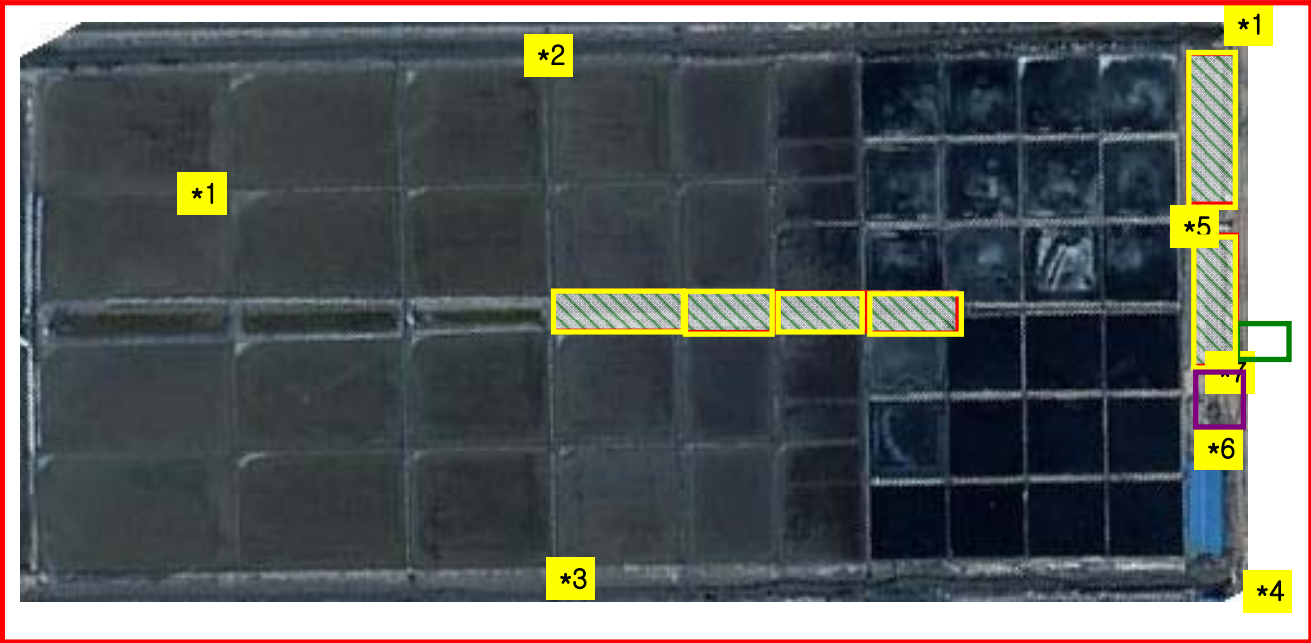수수료  
없 음

[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)

신안군 지도읍 태천리 394-8 슬레이트 철거공사 1/30						
						
판례	*NO					
	시료채취	부지경계선	대상 건축물	위생설비	폐기물반출구	음압기

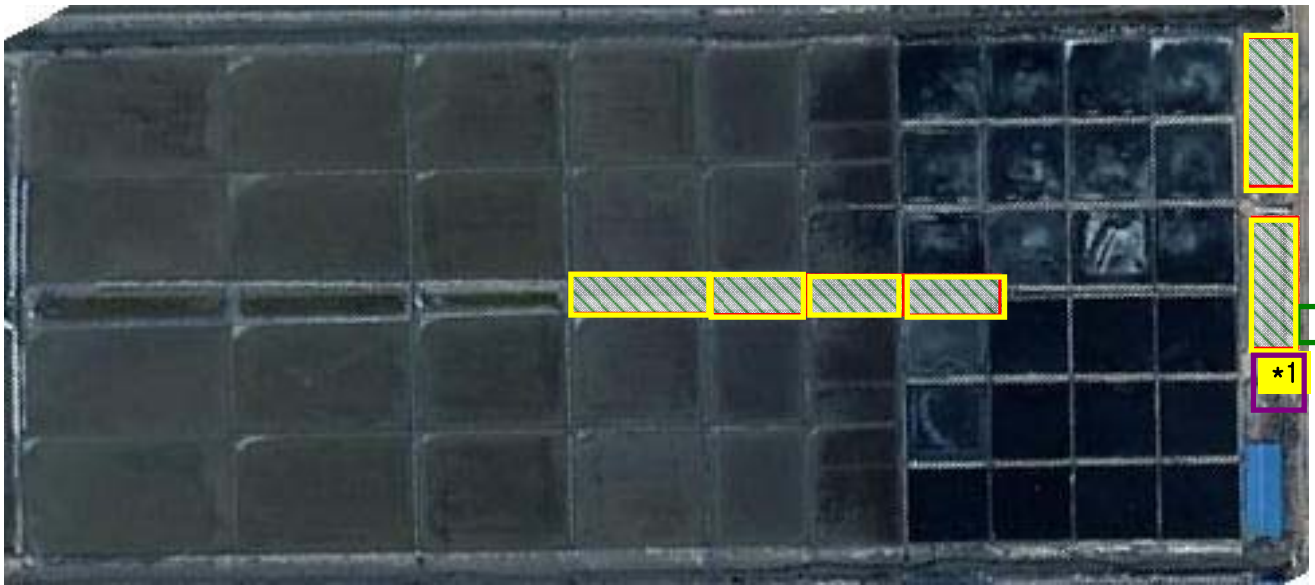

판례	*NO					
	시료채취	부지경계선	대상 건축물	위생설비	폐기물반출구	음압기


[별첨2] 측정 결과

2013. 01. 30					
측정위치		측정 간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	8:10 ~ 12:20	9.88	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	8:10 ~ 12:20	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	8:10 ~ 12:20	9.9	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	8:10 ~ 12:20	9.78	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	9:00 ~ 11:10	9.98	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*6	위생설비입구	9:00 ~ 9:45	9.78	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물 반출구	10:00 ~ 10:45	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만

2013. 01. 31					
측정위치		측정 간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	폐기물 반출구	8:30 ~ 9:15	9.98	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만

[별첨3] 측정 사진

2013 01.30.			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장 주변	*6. 위생설비입구	*7. 폐기물 반출구	

2013 01.31.	
	
*1. 폐기물 반출구	
