

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)순흥건설		사업자등록번호 410-86-33022	
	전남 장성군 장성읍 수산리 13-2번지 (전화번호: 062-383-3314)			
건 축 물	건물명 염전		위치 전남 신안군 비금면 도고리 506	
	연면적(m <sup>2</sup> ) m <sup>2</sup>		작업기간 2012.12.11~12.12	
	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] 석면 슬레이트( 520 m <sup>2</sup> ) (필요 시 별지 첨부)			
측정기관	대표자 (유한)돌숨석면연구소		사업자등록번호 418-81-30757	
	주 소 전북 전주시 덕진구 여의동 530-2번지			
측정 일시	2012.12.11~12			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	[ 뒷 면 별 첨 ]			

측정 지점 위치(도식도)

[ 뒷 면 별 첨 ]

「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2012년 12월 일










제출인 (서명 또는 인)

신안군수 귀하

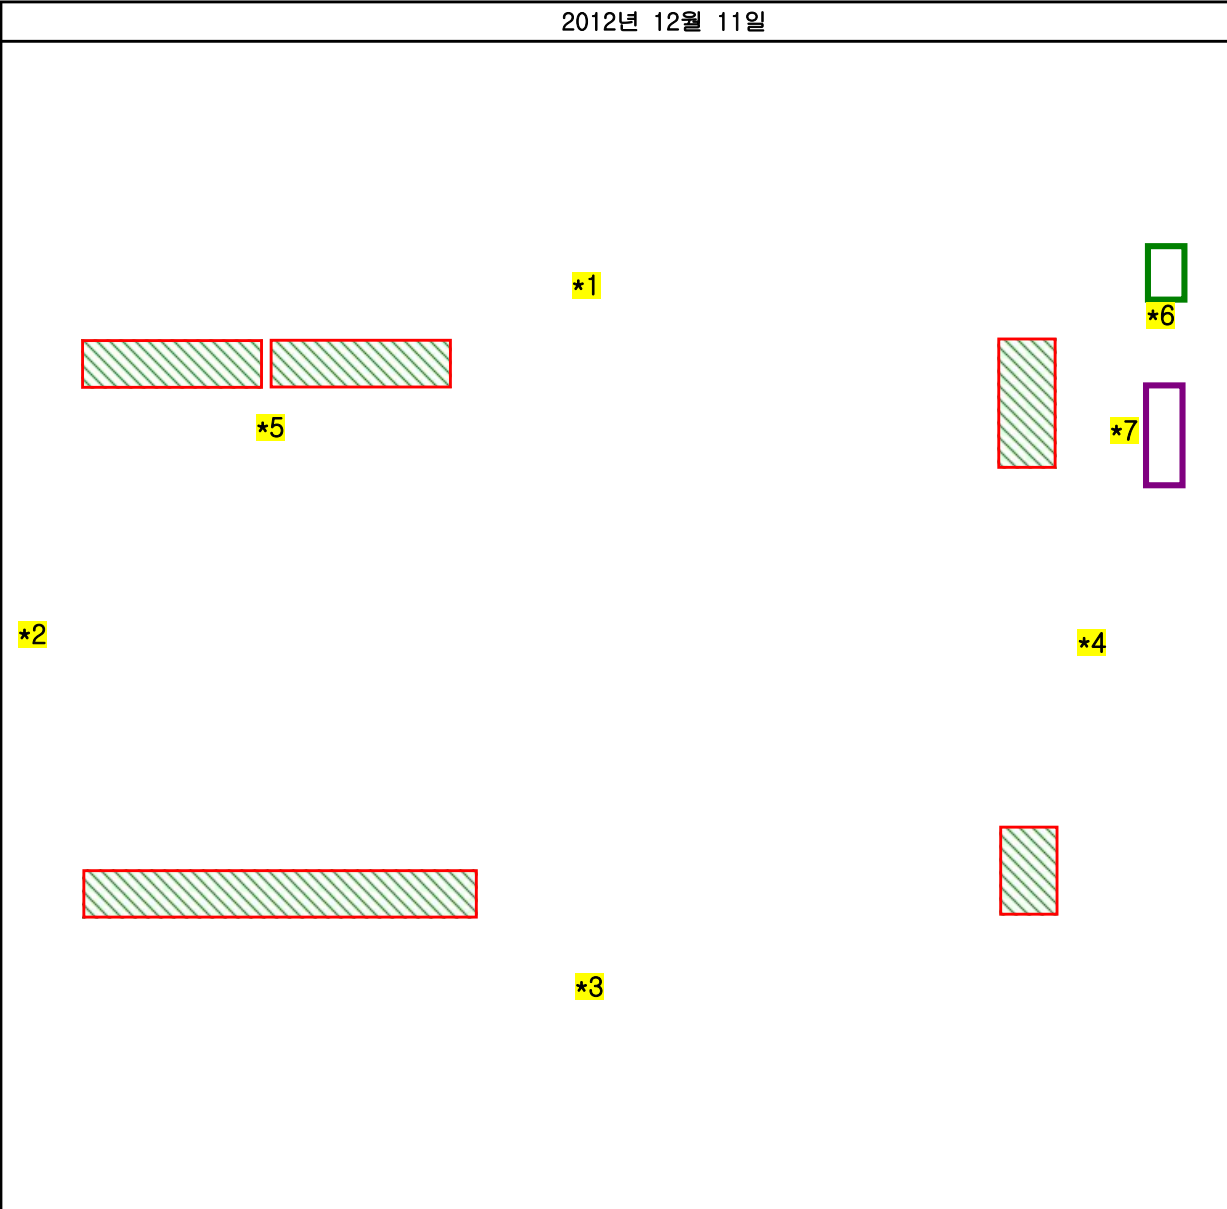


첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

## ❖ 측정결과

12월 11일				
시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
#1	부지경계선1	0.001	백석면(Chrysotile)	
#2	부지경계선2	0.002	백석면(Chrysotile)	
#3	부지경계선3	0.001	백석면(Chrysotile)	
#4	부지경계선4	0.001	백석면(Chrysotile)	
#5	작업장주변	0.002	백석면(Chrysotile)	
#6	위생설비입구	0.002	백석면(Chrysotile)	
#7	폐기물임시보관소	0.003	백석면(Chrysotile)	
12월 12일				
시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면	비고
#1	폐기물임시보관소	0.002	백석면(Chrysotile)	
※ 비고.				

2012년 12월 11일				
				
		#1 부지경계선1	#2 부지경계선	#3 부지경계선
				
		#4 부지경계선	#5 작업장주변	#6 위생설비입구
			 <b>돌솜석면연구소</b> Dolsom Asbestos Research Institute	
		#7 폐기물임시보관소		
		Drawing Title		
전남 신안군 비금면 도고리 506 슬레이트 철거공사				

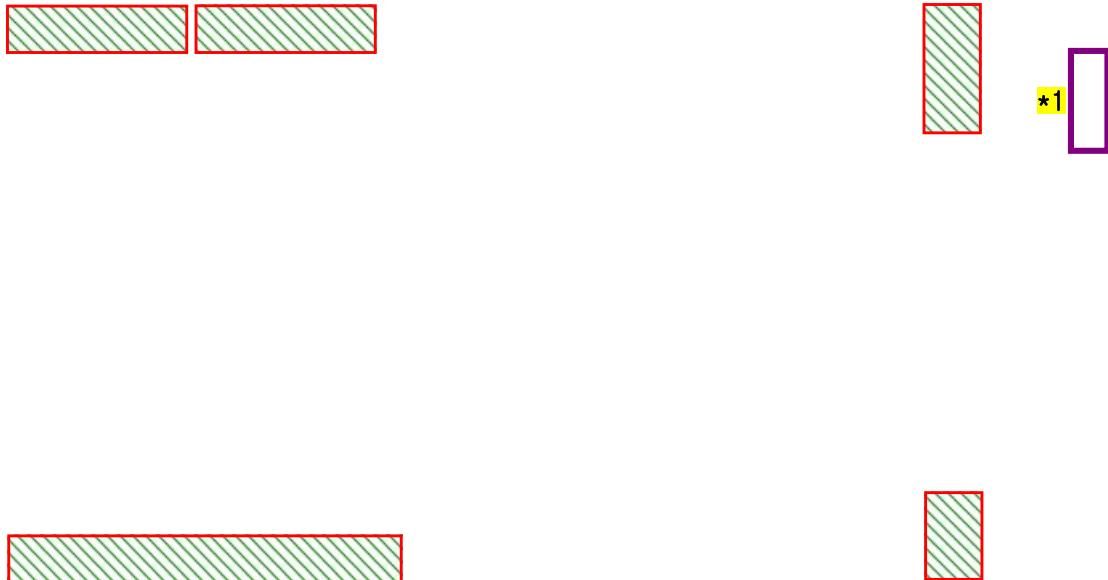※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

2012년 12월 12일			
			
	#1 폐기물 임시보관소		
	 <b>돌솜석면연구소</b> Dolsom Asbestos Research Institute		
Drawing Title 전남 신안군 비금면 도고리 506 슬레이트 철거공사			

※ 위 석면지도는 실제 건축물 치수와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
